Berthoud Belfort Weighing Bucket

NCWCD Headquarters, Berthoud, Colorado

	Ave wind speed at precip gauge mph	Estimated catch ratio %	Measured precipitation inches	Estimated actual precipitation inches
20-Dec-06	13.1	41	0.62	1.52
21-Dec-06	5.8	81	0.19	0.23
28-Dec-06	5.0	85	0.24	0.28
29-Dec-06	5.2	84	0.20	0.23
4-Jan-07	6.3	79	0.05	0.06
5-Jan-07	4.7	87	0.37	0.43
6-Jan-07	5.6	82	0.06	0.08
12-Jan-07	3.9	90	0.01	0.01
14-Jan-07	2.2	96	0.15	0.16
17-Jan-07	5.7	82	0.03	0.04
21-Jan-07	6.8	76	0.09	0.11
27-Jan-07	4.0	90	0.01	0.01
28-Jan-07	2.5	95	0.01	0.01
31-Jan-07	3.3	93	0.08	0.08
1-Feb-07	5.3	84	0.04	0.04
Total		66%	2.15	3.28

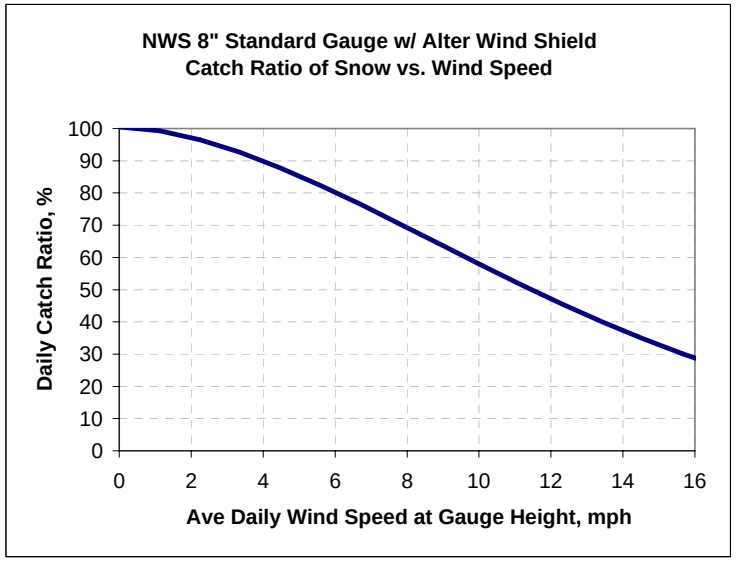
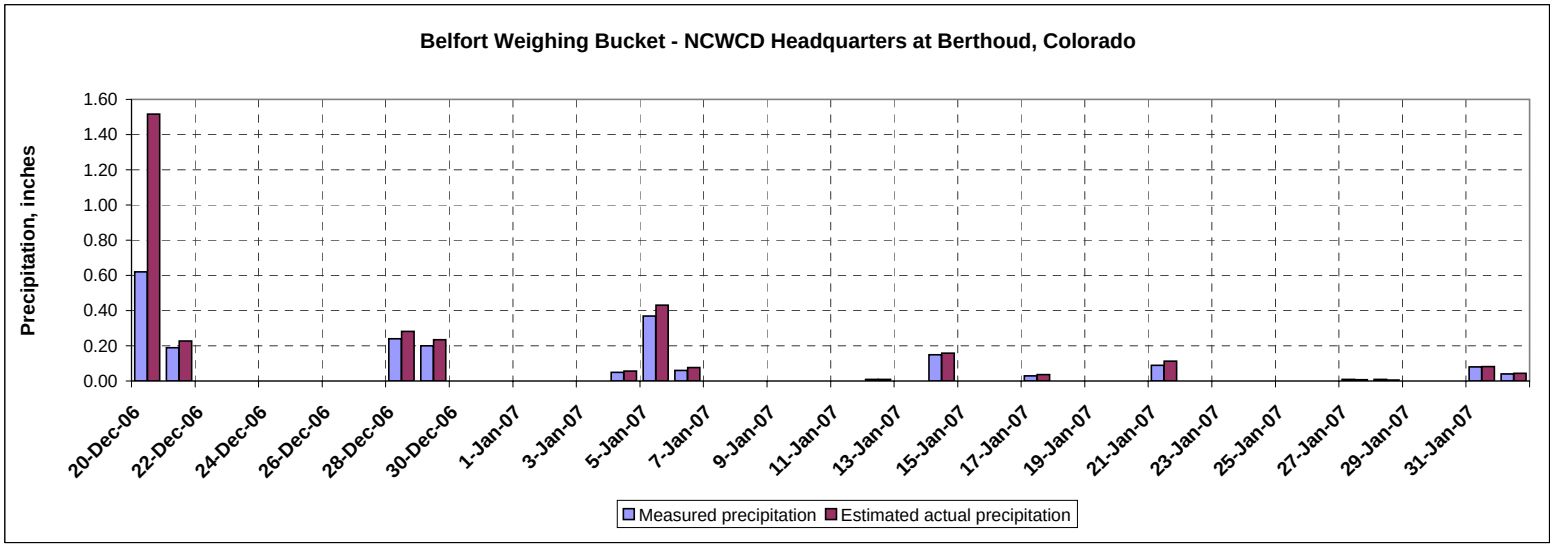
Water content of existing snow cover = 3.37 inches on 05-Feb-07 per M. Fiscus.
